



Proyecto de Diseño

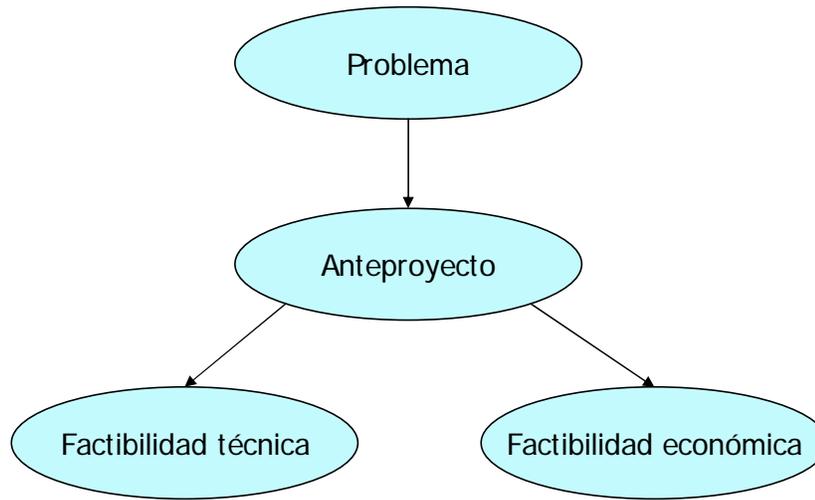

Planificación del proyecto

Actividades: Plazos, Requisitos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Servicios, Recursos Financieros

Plazos: Nº de unidades de tiempo requeridas para la actividad, Comienzo y Final


Requisitos: relación con otras actividades

Recurso humano: HH Ingeniero, HH Técnico, HH administrativo, Valor expresado en \$/HH

Recursos materiales: Insumos, Arriendo maquinarias, Transporte, etc. Valor expresadas en por uno


Servicios: Gas, agua, electricidad, telecomunicaciones, publicidad, en general prestaciones de terceros

Recursos financieros: Disponibilidad de fondos, costo de créditos





Carta Gant: Actividades

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	Diseño General	4 días	jue 08/05/03	mar 13/05/03		Ing
2	Diseño módulo 1	2 días	mié 14/05/03	jue 15/05/03	1	Ing
3	Diseño módulo 2	5 días	mié 14/05/03	mar 20/05/03	1	Ing,Tecnico
4	Armado módulo 1	2 días	vie 16/05/03	lun 19/05/03	1,2	Tecnico,Electronicos[5]
5	Armado módulo 2	3 días	mié 21/05/03	vie 23/05/03	1,3	Tecnico,Electronicos[20]



Carta Gant

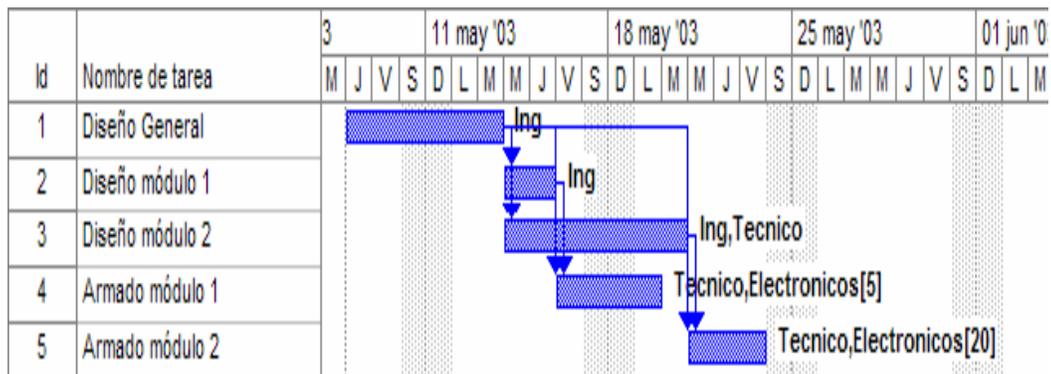




Carta Gant: Enclavamientos

Enclavamientos actividades:


Término – comienzo (tc):





Comienzo – comienzo (cc):



Término – término (tt):



Fecha predeterminada:



Costos

Costo Producción: Costos directos + gastos generales

Costos directos: Total HH* \$/HH + Total \$Materiales + Total \$Servicios + Total \$Financieros + etc.

